

OUR LADY OF HEALTH MATRICULATION SCHOOL

BUDALUR . THANJAVUR.Dt.613 602

தமிழ்நாடு அரசு அங்கீகாரம் பெற்றது

RECOGNISED BY THE GOVT.OF TAMIL NADU.




Budalur

Een nieuwe school met 4 klaslokalen en 2 "labs"



Budalur

Een nieuwe school met 4 klaslokalen en 2 “labs”



Stichting Thomas Bouwprojecten

Secretariaat

Telefoon

Mobiel

E-mail

Website

Rabobank

ING

Wilma Martens Liefink

Langeakker 29, 5735 HD Aarle-Rixtel

+31 (0) 492 38 26 39

+31 (0) 6 2028 0243

secretariaat@thomasbouwprojecten.nl

www.thomasbouwprojecten.nl

IBAN : NL47 RABO 0149 3087 87

IBAN : NL52 INGB 0000 3003 66

Kamer van Koophandel Eindhoven

Fiscaal nummer ANBI (RSIN)

nr. 41 09 25 42

8015.85.077





Inhoudsopgave

Inleiding en samenvatting projectverslag Budalur 2020-2022.....	3
Achtergrondinformatie van de school in Budalur door de jaren.	4
Budalur. Onze Thomas bouwgeschiedenis hier	5
Budalur: De situatie in 2020.	10
Ontstaan van het Budalur project.....	12
Het bouwontwerp en plan	13
Projectkosten. Offerte en keuze van de aannemer in maart 2021	15
Aanvang van het bouwproject in april 2021	19
Vertraging wegens Covid/Corona, en daarna herstart in september 2021	23
Oplevering, Inzegening, en Opening op 28 juli 2022	33
Financiële afsluiting van het project	41
Conclusie en samenvatting	42

Inleiding en samenvatting projectverslag Budalur 2020-2022

Dit rapport is het eindverslag van het Budalur project zoals gepland en uitgevoerd in de periode 2020-2022, en opgeleverd op 28 juli 2022. Na het ontstaan en aanleiding van het project, worden als achtergrond de situatie in Budalur en eerder uitgevoerde bouwprojecten beschreven. Daarna worden het plan en de vooraf geschatte kosten (offerte en contract) weergegeven. Vervolgens wordt beschreven hoe de uitvoering van het project is verlopen, en wat de finale realisatie-kosten waren.

Samenvattend kan gesteld worden dat het project succesvol is verlopen. Weliswaar is de tijdsplanning niet helemaal gehaald, omdat de bouwwerkzaamheden door Covid vertraging opliepen, maar de oplevering was toch nog op tijd voor het begin van het schooljaar 2022-2023. Financieel gezien is de geplande bouw conform de begroting daarvoor verlopen; met onze instemming zijn wel enkele kleine planwijzigingen aangebracht en is ook inventaris-aanschaf toegevoegd, welke beide extra kosten betekenden; de totale kosten bleven overigens wel binnen de voor het project beschikbare financiële ruimte.



Achtergrondinformatie van de school in Budalur door de jaren.

Budalur is gelegen in de deelstaat Tamil Nadu tussen de steden Trichy en Tanjore, 250 km ten zuiden van Chennai. Het heeft ongeveer 8400 inwoners (google 2021).

Vanaf 1989 runnen de Franciscan Sisters of St. Joseph er een English Medium school waarvan het aantal leerlingen is gegroeid van 50 naar 1024 (551 jongens en 473 meisjes) in 2019 en 1133 in 2021

Het is een school voor jongens en meisjes in de leeftijd van kleuter tot 15 jaar (de 10^e klas).

Het schoolsysteem in India ziet er iets anders uit dan in Nederland. Na een of twee jaar kleuteronderwijs (Kindergarten) begint een leerling vanaf 6 jaar op de Primary school (1th t/m 7th Standard). Vanaf 8th Standard zit je op de Lower Secondary school ook wel High school genoemd. Na 10th Standard zijn de leerlingen verplicht deel te nemen aan een staatsexamen. Na het behalen van dit examen kunnen de leerlingen kiezen voor (theoretisch) vervolgonderwijs of beroepsonderwijs. Maar zijn de leerlingen ook niet meer leerplichtig, dus verlaten veel kinderen het onderwijs om te gaan werken.

Het onderwijs kent twee verschillende niveaus Tamil Medium en English Medium. Scholen waar Tamil Medium wordt onderwezen, onderwijzen in minder vakken en de lessen zijn geheel in Tamil. De lessen van een school waar English Medium gegeven wordt zijn vanaf 5th vrijwel geheel in het Engels.

De school heeft als naam: **OUR LADY OF HEALTH MATRICULATION SCHOOL.**

Een Matriculation school is een school waarop je het staatsexamen na afloop van het 10^e jaar kunt afleggen.

De kinderen op de school zijn overwegend afkomstig uit gezinnen van dagloners zonder eigen land.

De parochie telt bijna 1000 gezinnen, waardoor het aantal katholieke kinderen ongeveer de helft van het totaal is.

De school begon oorspronkelijk op de grond van het bisdom en bestond tot 2004 uit een aantal geïmproviseerde open gebouwen voorzien van stro-daken.

In januari 2021 zijn er 14 klaslokalen.



Budalur. Onze Thomas bouwgeschiedenis hier

2002: Project 69 Toiletgebouw. Totale kosten €16.600

De school in Budalur functioneert prima maar is geheel ondergebracht in voorlopige en provisorische bouwsels. Toiletten voor de kinderen zijn van dezelfde orde: zeer primitief en onvoldoende.

De huidige schoolgebouwen staan op grond van het bisdom, en deze heeft een andere bestemming voor de grond. Derhalve dienen de zusters hun school te verhuizen naar een aangrenzend stuk terrein dat ze van het bisdom in eigendom hebben gekregen. Onze stichting zorgde voor deze nieuwe school voor een toiletgebouw én drinkwatervoorziening.

2004 Project 78 nieuwe school Totaal 8 klassen. Totale kosten € 42.000

Zowel het bisdom als de overheid willen dat de zusters de slechte huisvesting van de school verbeteren.

In 2002 is door dezelfde aannemer van het toiletgebouw met weinig geld ook een schoolgebouw met 6 klassen neergezet (op kosten van de zusters) om alvast een van de slechte gebouwen te kunnen vervangen en ook het groeiende aantal kinderen op te vangen. Verschillende klassen zijn ondergebracht in voorlopige bouwsels afgedekt door een dak van palmblederen. Na de dramatische brand in het nabijgelegen Kumbakonam waarbij in een brand in een school met een soortgelijk dak meer dan 100 kinderen in de vlammen omkwamen, moesten deze bouwsels van de Overheid onmiddellijk worden afgebroken. Nog meer gebrek aan klaslokalen dus.

De Overheid dreigde nu (=2004) de licentie voor het geven van onderwijs in te trekken indien niet op korte termijn minstens nog 8 klassen worden gebouwd.

Omdat het bouwen van een etage op het bestaande gebouw geen optie was vanwege een onduidelijke constructie en een te geringe dieptemaat, waardoor de klassen niet aan de wettelijke eisen zouden kunnen voldoen, is gekozen voor een nieuw gebouw met 8 standaard klassen.

Er wordt gebouwd op de begane grond en op de 1e verdieping. Totaal 8 klassen. Totale kosten € 42.000



Nieuwe school 2004 met 8 klaslokalen

2007 project 97 Totale kosten van dit project € 20.200

Dit project bestaat uit 3 delen.

De renovatie/afbouw van het oude schoolgebouw met 6 klassen, alleen begane grond, afmetingen 38 x 7,5 meter. Dit gebouw is in het verleden met minimale kosten door de zusters gebouwd. Helaas was er geen geld om ramen, deuren en elektrische verlichting aan te brengen. Ook moest de indeling van het gebouw meer functioneel, lekte het dak en was het aan een schilderbuurt toe.

Het 2e onderdeel van het project was de bouw van ongeveer 40 meter afscheidingsmuur. Het gehele schoolterrein zou eigenlijk moeten worden ommuurd vanwege aangrenzende woningen en de overlast die dat soms tot gevolg heeft. Dat is voorlopig een te kostbare wens. Het stuk muur dat nu gebouwd is voorkomt dat de bewoners hun vee op het schoolterrein laten grazen en daarbij alle aanplant van bomen en struiken onmogelijk maken.

Verder wordt er nog een gebouwtje gezet met 2 klassen met in de ene ruimte de computerklas en in de andere ruimte de administratie, schoolhoofd en lerarenkamer.



Het op te knappen gebouw voor



En na renovatie



Een stuk van de nieuw gebouwde compound wall



Het nieuwe schoolgebouwtje met 2 lokalen



Het nieuwe schoolgebouwtje (rechts) naast de nieuwe school uit 2004



Uitbreiding gebouwen 2012-2014

Wegens het steeds groeiende aantal leerlingen (in 2014 gestegen tot 1042) ontstond er dringende behoefte aan additionele klasruimtes. Ook de overheidsinstanties stelden als eis voor verlenging van de onderwijsvergunning dat er nieuwe klassen zouden worden bijgebouwd. Uit bezoekverslagen van onze projectleiders hierover:

Matriculation School

Waren er vorig jaar 930 leerlingen, dat is dit jaar gestegen tot 1042.

Er huizen 4 klassen in de vansheds en op de veranda van de school is ook een klas ondergebracht.

Verder bevinden zich ook nog 2 klassen op de veranda van het convent.

De nood is hoog en de overheid vraagt om directe maatregelen, vandaar dat Budalur nu zo'n hoge prioriteit heeft. Men vraagt zelfs voor de toekomst een helling of een lift voor gehandicapten.

Onmiddellijk worden 7 klaslokalen gevraagd, zodat de hoogste nood is geledigd. Maar zoals bekend worden er voor een matriculation school ook 4 lab ruimten gevraagd.

Al toen er door ons ongeveer 6 jaar geleden 2 klaslokalen zijn gebouwd was dat niet voldoende en hebben de zusters er zelf 2 op gebouwd. Toen al was een lab nodig, een library, officeroom and staffroom, ruimten, die nu vanwege ruimtegebrek zijn gecombineerd.

Een bevriende engineer heeft een plan gemaakt voor 9 klaslokalen, echter allemaal op de begane grond en om de 3 lokalen een trappenhuis. Dat kan goedkoper door een verdieping erop te zetten en een trappenhuis om de 4 lokalen.

Een goed idee is wel het trappenhuis naar voren te halen, waardoor erachter ruimte ontstaat, waar dan b.v. toiletten onder gemaakt kunnen worden. Ik heb zelf al eens voorgesteld ongelijke trapsteken te maken. Vanaf b.g. met één steek naar het bordes van 2,40 m +, dan is de ruimte onder het bordes helemaal te gebruiken.

De zusters vragen ons om een tekening te maken, dat kan dan een kopie zijn van Damaracherla met de hierboven aangegeven aanvullingen. Die moet dan vóór mei 2014 naar Alex Jacob worden gestuurd en door Prudentia naar Elisabeth worden gebracht. Zij zal dan zorgen dat de bevriende engineer het plan ter beoordeling indient bij de overheid.

Helaas waren er bij Thomas Bouwprojecten in die periode geen financiële middelen aanwezig om dit te realiseren. Daarom zijn deze bouwactiviteiten door de Zusters zelf gefinancierd. Bij een bezoek van onze projectleiders Hans en Jos blijkt dat de zusters inderdaad zelf met de bouw zijn begonnen.

Budalur: De situatie in 2020.

Onderstaand foto's geven een beeld van de situatie in Budalur in 2020





Bovenstaande foto is van de facebook site van de school. Goed te zien hoe er een stuk aan de school uit 2004 is aan gebouwd.

Deze video, te zien op onze website, geeft een goed panoramisch beeld van de campus in Budalur. <https://thomasbouwprojecten.nl/projecten/budalur-4-klaslokalen-en-2-labs/>



Ontstaan van het Budalur project

De aanleiding tot het ontstaan van het Budalur project werd in 2020 gegeven door Bert van Leijsen, penningmeester van de Stichting Thomas Bouwprojecten in de periode 1999-2002. Gemotiveerd door zijn toenmalige positieve ervaringen met het werk van de Zusters en onze Stichting, besloot hij via zijn nalatenschap dit werk te willen ondersteunen.

Zijn voorkeur ging daarbij uit naar de realisatie van een schoolgebouw in Tamil Nadu provincie, Zuid-India. Qua locatie viel daarbij de keuze op Budalur. Daarbij speelde zijn betrokkenheid bij bouwprojecten van de Stichting in Budalur gedurende zijn periode als penningmeester ook een rol.

In Budalur was dringend behoefte aan een additioneel schoolgebouw. Dit enerzijds wegens het nog steeds groeiende aantal leerlingen in de bestaande 1st-10th grade onderwijsniveaus.

Maar anderzijds ook omdat een uitbreiding naar Higher Secondary onderwijs (11th-12th grade) gepland werd, zodat aan de leerlingen in de toekomst ook vervolgonderwijs op dit niveau geboden zou kunnen worden en de studenten daarvoor niet naar een andere locatie zouden moeten.

Zulk een uitbreiding van de scope van het onderwijs wordt door de Zusters ook beleidsmatig als belangrijk gezien voor de continuïteit van haar onderwijsinstellingen in Zuid-India.


Het bouwontwerp en plan


De vastgestelde behoefte was een gebouw met 4 klassen en 2 labs. Beschikbaar zijn foto's, video, een site-layout, en een tekening voor het gebouw. Deze tekening is lokaal gemaakt al in 2016, en gebruikt om overheidsgoedkeuring te krijgen. Wel is de 2016 tekening nu aangepast, door classrooms toe te voegen en een office room en een staff room weg te laten.

Afhankelijk van beschikbare vs. benodigde budgetruimte zou later nog het meubilair in het project betrokken kunnen worden.

Classrooms zijn nu gedimensioneerd op 6.1 X 6.1 M = 37.2 M² en voldoen daarmee aan de eisen voor vloeroppervlakte per student.

Qua timing moet in verband met de vergunning in ieder geval voor aanvang van het volgende academic year met de bouw begonnen zijn. Dat lijkt op dat moment alleszins mogelijk.

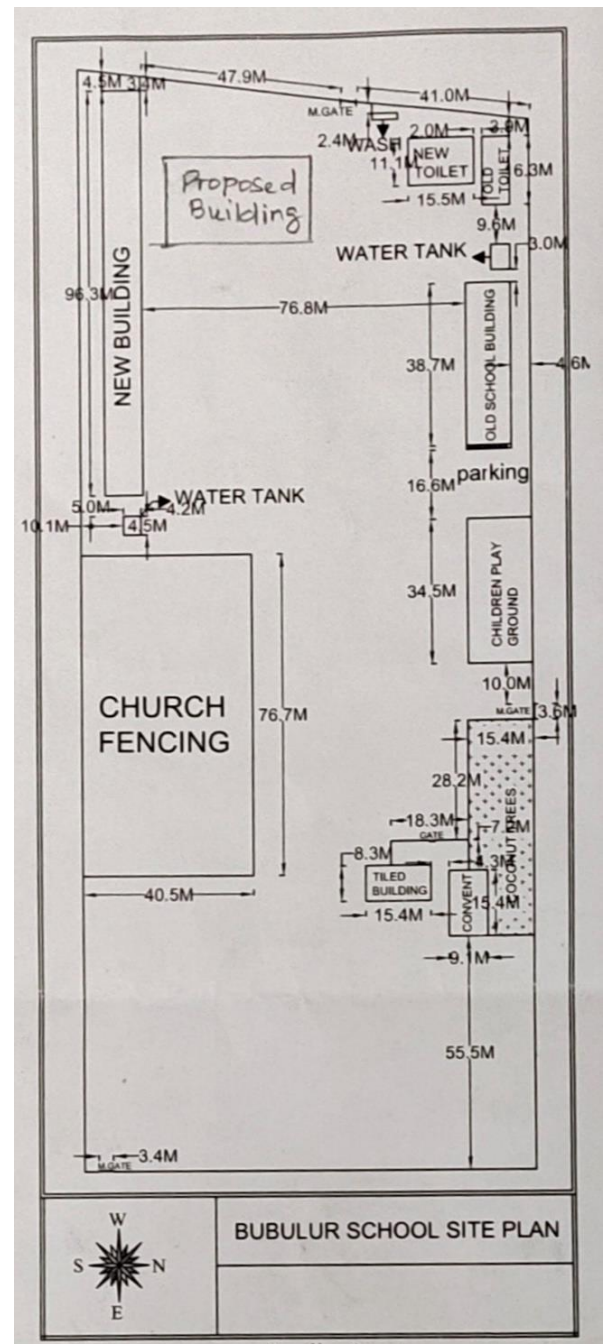

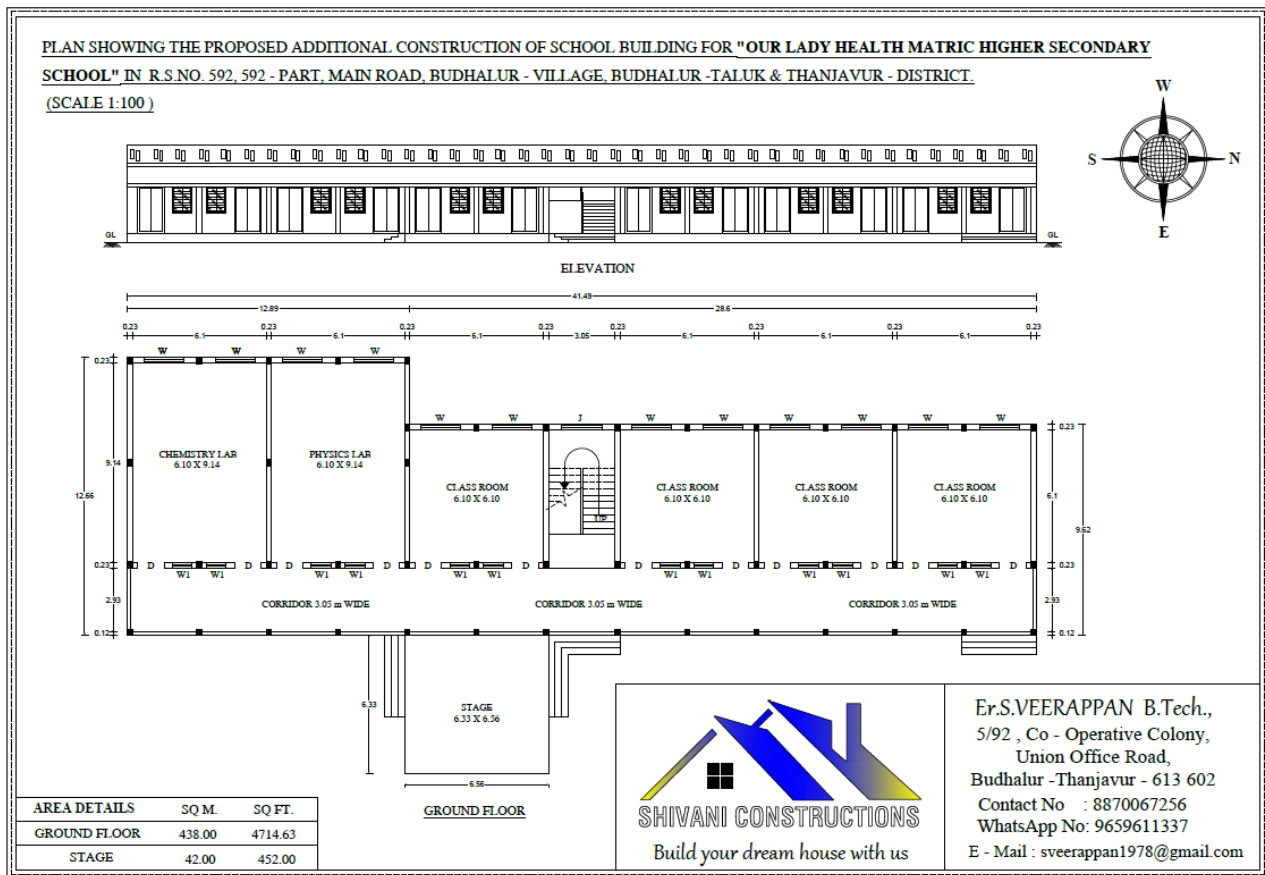

De ontwerptekening



En hier moest het nieuwe gebouw gaan komen.



Projectkosten. Offerte en keuze van de aannemer in maart 2021

Eind 2020 / begin 2021 was duidelijk hoeveel budgetruimte er was voor het project. Met dit als achtergrond werd, zoals ook beleidsmatig voor projecten van deze omvang altijd gebeurt, offerte gevraagd aan 3 aannemers.

De ontvangen offertes bedroegen :

- Stephen € 96.500
- Marcus € 98.500
- Veerappan € 126.500

Op basis hiervan, en de positieve ervaringen die wij bij diverse projecten in het verleden met deze aannemer hadden, viel de keuze op Stephen, en werd het werk aan hem vergund.

Bij de bedragen dient nog aangetekend te worden dat nog rekening gehouden moest worden met door de Zusters zelf aan te schaffen zaken en enige direct door hen te betalen kosten.

Inclusief een kleine toevoeging voor onvoorzien, werd het project in maart 2021 finaal goedgekeurd voor een totaal begroot bedrag van € 100.000.

Voor de volledigheid volgt hieronder de offerte van aannemer Stephen.



M.S.T.CONSTRUCTIONS CIVIL ENGINEER & CONTRACTOR

350, Dr. Radhakrishnan Road, Tata bad, Coimbatore-641 012, Phone: 2497596, Cell 94434-79559

Ref :

DATE:

ESTIMATE FOR PROPOSED CONSTRUCTION OF CLASS FOR OUR LADY OF HEALTH METRIC H.R. SECONDARY SCHOOL BUDHALUR

-1-

SNO.	Details of works	unit	Rate	Quantity	Amount
1.	Earth work excavation in foundation footing and plinth beam	1m3	463	252	1,16,676
2.	P.C.C. 1:5:10 in footing, unbedded tie beam and flooring using 40 mm metal plinth protection using M-sand	1 M 3	4591	114	5,23,374
3.	Filling the footing pit using excavated earth followed by water consolidation	1M3	320	208	66,560
4.	Filling the basement with earth brought from outside followed by water consolidation	1m3	1500	78	1,17,000
5.	Filling the basement and foundation to a depth of 0.15m using crusher dust followed by water consolidation	1m3	2135	87	1,85,745

Soman Stephen 11/03/2021
Er. Soman Stephen, B.E.,
Civil Engineer & Contractor
350, Dr. Radhakrishna Road,
Tatabad, Coimbatore - 641 012

S.N O.	Details of works	unit	Rate	Quantity	Amount
6.	R.C.C. Concrete except steel using M20 concrete and 20 mm metal as detailed below using m-sand				
	i).Footing concrete	1m3	8885	36	3,19,860
	ii)Column Concrete	1m3	16444	18	2,95,992
	iii)Plinth level beams	1m3	14200	17	2,41,406
	iv) sil level and lintel level beams	1m3	15177	5.26	79,831
	V) Roof Level "T" and "L" beams	1m2	17425	21	3,66,492
	Vi) Roof slab concrete	1m3	16905	60	10,14,300
	Vii) Sun Shade	1m2	1538	57	87,666
7.	Brick work at plinth level and super structure using well burnet chamber bricks using cm 1;6 , M sand	1m3	8969	93	83,4,117
8.	Half brick partition wall using cm 1:4	1m2	1614	25	40,350
9.	i)Celling plastering using cm 1:3 and m- sand	1m3	387	429	1,66,023
	ii) Plastering the exposed "L" and "T" beams AND SUNSHADE using cm 1:3 and M-sand	1m2	632	300	1,89,600
10.	Black board making	6 nos	5000		30,000
11.	Plastering the inside and outside walls using cm 1:5 and M-sand	1m2	365	1645	6,00,425
12.	Supplying and fixing flush door with steel frames with concrete filled in it. (sharon ,sainic oswin)	1 M 2	5091	25.2	1,27,275
13.	Supplying and fixing steel grill for Windows	1m2	2162	49	1,05,938
14.	Laying Ellispattern finish on the floor 1:2:4	1 M 2	565	444	2,50,860
15.	Supplying and fixing (Upvc windows (L.G. Hausya)	1 M 2	7950	48.6	3,81,510
16.	Precast slab to the shelves and fixing it	1m2	1248	43	57,645
17.	Enamel painting the inner wall two coat 1.5 M from floor	1M2	183	315	54,180

Soman Stephen 11/03/202
Er. Soman Stephen, B.E.,
 Civil Engineer & Contractor
 350, Dr. Radhakrishna Road,
 Tatabad, Coimbatore - 641 012

-3-

18.	White washing the ceiling and colour washing the inner walls using tractor Emulsion two coats over a coat of primer	1M2	118	1215	1,43,370
19.	Steel door to head room	1m2	3766	2.1	7,908
20.	Ellispattern timish on terrare using 1:2:4	1m2	591	439	2,59,449
21.	Colour washing the outer wall using exterior Emulsion ace two coats	1m2	129	771	99,459
22.	i) Enamel painting the windows grill two coats over a coat of primer ii) Enamel painting doors two coats	1m2 1m2	250 130	96 68	24,000 8,840
23.	Providing eletrical arrangements with in the building without fittings such as fans and tube lights	-		L.S	1,90,000
24.	Temite proofing building	-		L.s	75,000
25.	Supplying and plastering in position at Fe 500 Grade steel	1ton	68000	19.0	12,92,000
26.	Fitting Rain Drain Pipe	1Rft	445	20	8,900
27.	Supplying and fixing sheet to the head room roof			L.s	25,000
ToTal					83,86,751

(Rupees Eighty Three lakhs Eighty Three Thousand Seven hundred and Fifty one only)

Note :-

Andhra Cement will be used

M-Sand used

Water and Electricity Should be supplied free of cost

Soman Stephen 11/
Er. Soman Stephen, B.E.,
 Civil Engineer & Contractor
 350, Dr. Radhakrishna Road,
 Tatabad, Coimbatore - 641 012

Aanvang van het bouwproject in april 2021

Nu de aannemer gecontracteerd was en het project finaal goedgekeurd was, konden in april 2021 de bouwwerkzaamheden beginnen.

Onderstaande foto's zijn genomen op 28 april 2021 bij de plechtigheden die bij zulk een start van een bouwproject in India gebruikelijk zijn.









Vertraging wegens Covid/Corona, en daarna herstart in september 2021

Kort na de formele start van de bouwwerkzaamheden sloeg de Covid pandemie zeer hard toe, ook in India, en ook in de regio in en rond Budalur. Door de overheid werden zeer strenge maatregelen genomen.

Daarbij behoorden ook beperkingen op het vervoer van bouwmaterialen en verbod op reizen van het bouwpersoneel. De site van de school werd ook de facto helemaal afgesloten. En het project lag daarmee enkele maanden stil.

Pas in september 2021 kon er weer doorgewerkt worden, waarvan onderstaande foto's een beeld geven.





In november 2021 begon ook bovengronds de voortgang zichtbaar te worden.





In december op verdiepingshoogte



In januari 2022 werd de verdiepingvloer gestort



In februari 2022 veel aandacht van iedereen



... en hard doorwerken



Maart 2022: de muren worden opgetrokken.



En eind april / begin mei 2022 is het al een duidelijk gebouw geworden



Juni/Juli 2022: afwerken en controle





In deze fase kon gelukkig ook Jos Dijkers, projectleider bij Thomas Bouwprojecten, na een lange onderbreking van helaas 2 jaar vanwege Corona, weer op inspectiereis naar India.

Een van de belangrijkste activiteiten op deze reis was het bezoeken van de site in Budalur, de controle en inspectie van de bouwwerkzaamheden en de kwaliteit van het werk.

Zijn conclusie was dat de aannemer had gewerkt volgens plan en specificatie, en dat de geleverde kwaliteit goed was.



Oplevering, Inzegening, en Opening op 28 juli 2022

Tien maanden na de herstart van het project na Covid, was het gebouw gereed voor oplevering.

Op 28 juli 2022 was het dan zover dat de inzegening en officiële opening konden plaats vinden. Dat gebeurde in aanwezigheid van onder anderen Sr. Arockiam (FSJ Moeder Overste), Sr. Prudentia (FSJ Assistent Overste, en onze steun en toeverlaat voor onze bouwprojecten), andere leden van de Congregatie-Council, Sr. Joseline (FSJ Overste in Budalur) en tal van andere locale en provinciale leiders van de FSJ Congregatie, en van geestelijken in het bisdom.

En, zoals bij het begin van het project afgesproken, waren uit Nederland namens de sponsor en de gehele familie van Leijsen, ook aanwezig Carla van Leijsen en Lia Weerdenburg.

De volgende foto's geven een beeld van deze bijzondere gebeurtenis.

















Financiële afsluiting van het project

Tot slot van dit eindrapport van het Budalur project geven we de financiële verantwoording en afsluiting.

Zoals eerder vermeld is het project formeel goedgekeurd en gestart op een initiele begroting van € 100.000.

Hierin waren begrepen het met de aannemer gecontracteerde bedrag, alsmede enkele posten voor door de Zusters zelf in te kopen materialen en direct te betalen kosten.

Tijdens het project zijn door ons een paar planwijzigingen en daarbij behorende meerkosten van ca. € 1.500 geaccepteerd, te weten

- Het plaatsen van vloertegels in het administratie- kantoor
- Het maken van een overdekte verbinding tussen het nieuwe gebouw en de bestaande school

Daarnaast is ook ingestemd met de aanschaf van laboratoriumtafels ter waarde van € 14.500 voor de natuurkunde en scheikunde-labs op de 1^e verdieping van het gebouw.

De eindafrekening zoals opgesteld in India zag er op 16 augustus 2022 als volgt uit (in Indiase Rupees).

Budalur Construction Account.Account as on 16.08.2022

Expenses.

Payment to contractor Stephen	Rs.	28.07.744.00
Lab and stage work	Rs.	17,10,528.00
Steel Direct Payment	Rs.	12,45,278.00
Plumbing and Electrical work	Rs.	2,55,000.00
Painting work	Rs.	3,92,000.00
Centering bar Bending	Rs.	10,81,978.00
UPVC windows	Rs.	3,80,573.00
Office tile work	Rs.	53.810.00
Joint work	Rs.	67.134.00
Toilet work	Rs.	1.12.251.00
Bricks	Rs.	1.89.000.00
GST (Paid)	Rs.	1.62.000.00
GST (paid)	Rs.	90,000.00
GST	Rs.	55.394.00
Alex Jacob (paid)	Rs.	1.34.992.00
Lab tables	Rs.	6,18,691.00
Already paid.	Rs.	93.56.373.00
Yet to pay		
Soman Stephen Retention Amount	Rs.	2.05.000.00
GST 18%	Rs.	36.900.00
Total yet to pay	Rs.	2.41,900.00
 Grand total expenses	 Rs.	 95.98.273.00



In september is hieraan nog toegevoegd voor Lab Tafels die aanvankelijk in Budalur lokaal waren betaald een bedrag van Rs. 5.37.454.00.

Dat brengt het finale Grand Total Expenses in India op Rs. 101.35.727.00.

Als equivalent van bovengenoemde expenses (in Indiase Rupees) hebben wij naar India overgemaakt een bedrag van € 100.000 in 2021 en € 18.420 in 2022, totaal € 118.420 (gemiddeld tegen een koers van Rs 85.591 per Euro).

Daarnaast hebben wij in Nederland nog € 2.485 aan reiskosten betaald.

Daarmee komt het totaal van de projectbestedingen in Euros uit op € 120.905.

Conclusie en samenvatting

Samenvattend kan gesteld worden dat het project succesvol is verlopen. Weliswaar is de tijdsplanning niet helemaal gehaald, omdat de bouwwerkzaamheden door Covid vertraging opliepen, maar de oplevering was toch nog op tijd voor het begin van het schooljaar 2022-2023.

Financieel gezien is de geplande bouw conform de begroting daarvoor verlopen; met onze instemming zijn wel enkele kleine plan-wijzigingen aangebracht en is ook inventaris-aanschaf toegevoegd, welke beide extra kosten betekenden.

De totale kosten bleven overigens wel binnen de voor het project beschikbare financiële ruimte.

Graag bedanken wij iedereen die heeft bijgedragen dit project tot een succes te maken.

Op de eerste plaats natuurlijk de sponsor, Bert van Leijssen die de financiële middelen heeft verschaft, waarmee dit project mogelijk werd gemaakt. Ook dank aan zijn familie die de gehele tijd intensief bij het project betrokken waren en hun medewerking verleenden.

Ook dank aan de Congregatie FSJ (Franciscan Sisters of St. Joseph) in India die dit project gedurende de moeilijke Covid tijd in India hebben aangestuurd en tot voltooiing hebben gebracht. In het bijzonder denken wij dan natuurlijk aan Sr. Prudentia (Assistent Algemeen Overste van de Congregatie) en Sr. Joseline (de plaatselijk Overste van de Congregatie in Budalur).

Tenslotte ook dank aan onze projectleiders Jos Dijkers en Sterre Maessen die vanwege Covid vaak op afstand vanuit Nederland het project moesten volgen en aansturen.



En toen ...

... was het tijd ...



... voor de ...

... schoollessen.

